

Dear neighbour

Annwyl Gymydog

Cylchlythyr Prosiect Ysgol Bro Taf

Mawrth 2024

Cymunedau Dysgu Cynaliadwy
Sustainable Communities for Learning



Llywodraeth Cymru
Welsh Government



MORGAN SINDALL

CONSTRUCTION

safe

on time

snag free

delighted client

recommended

Helo, croeso i gylchlythyr mis Mawrth ar gyfer prosiect Ysgol Bro Taf.

Cynnydd

Mis da arall o gynnydd, a mis arall yn nes at gwblhau'r gwaith. Mae'r ardaloedd awyr agored yn dod at ei gilydd yn dda, gyda'r ffordd i lawr at y caeau rygbi bron â chael ei gorffen a maes parcio arall wedi'i agor ar gyfer yr ysgol. Mae'r wal gynnal sy'n ffurfio'r ardaloedd allanol wedi cael ei chwblhau ac mae'r sylfeini ar gyfer y canopiâu wedi cael eu tywallt. Mae'r ffenestri a'r drysau terfynol wedi cael eu rhoi yn eu lle, gan roi edrychiad lliwgar i'r adeilad.

Y tu mewn, mae'r waliau wedi cael eu gosod ac mae'r gwaith gosod mecanyddol a thrydanol yn mynd yn dda ac yn barod i ddod â'r adeilad yn fyw.




Mae sgaffaldiau'n dal i fod yn y Neuadd Chwaraeon, a bydd hyn yn ein galluogi i osod y paneli Ffotofoltaig ar y to sy'n rhan o ethos Carbon Sero Net yr ysgol newydd.

Mae gwaith ar y cae 3G hefyd yn cyflymu. Mae angen gwneud rhywfaint o waith eto i wneud yn siŵr bod yr ardal gyfan yn wastad. Yna, gallwn osod yr haen tarmac a'r carped.

Ymgysylltu ag Ysgolion

Cawsom hyd yn oed fwy o ymwelwyr o Ysgol Gynradd Cilfynydd, gyda blynyddoedd 3 a 4 yn ymweld â'r safle i gael cipolwg, gan wneud yn siŵr ein bod ni'n gwneud gwaith da.

Yn olaf, mae person ifanc lleol wedi mwynhau cyfnod o brofiad gwaith ar y safle gyda ni. Mae'n dymuno gweithio yn y diwydiant adeiladu yn y dyfodol. Mae ef yn mwynhau 4 wythnos o brofiad gwaith gyda ni ar hyn o bryd, ac yn manteisio ar y cyfle i weld pob elfen o grefftau adeiladu.

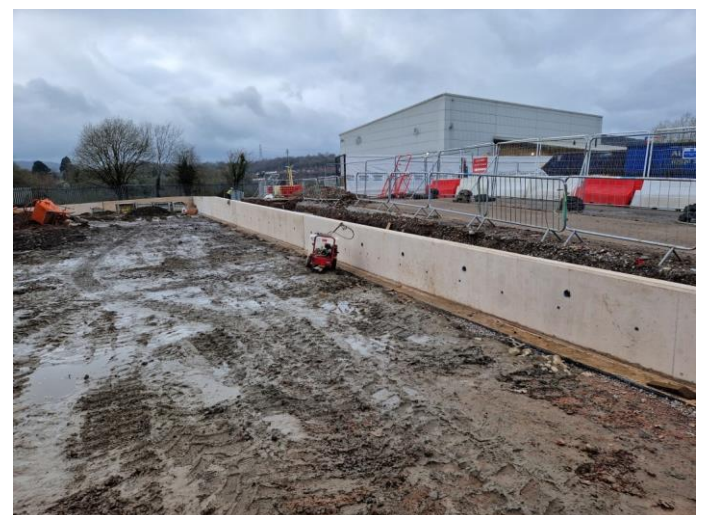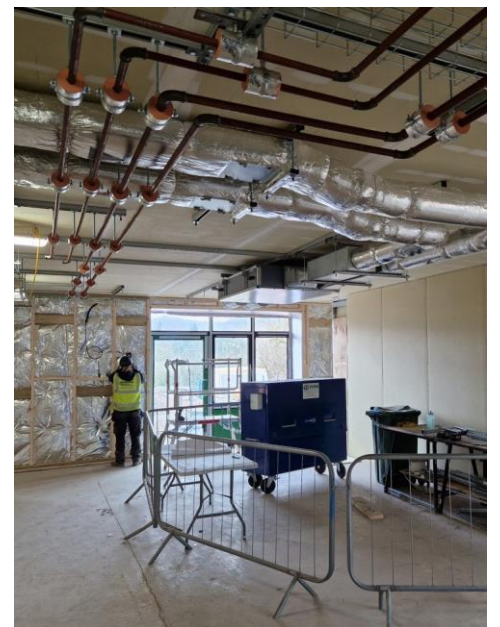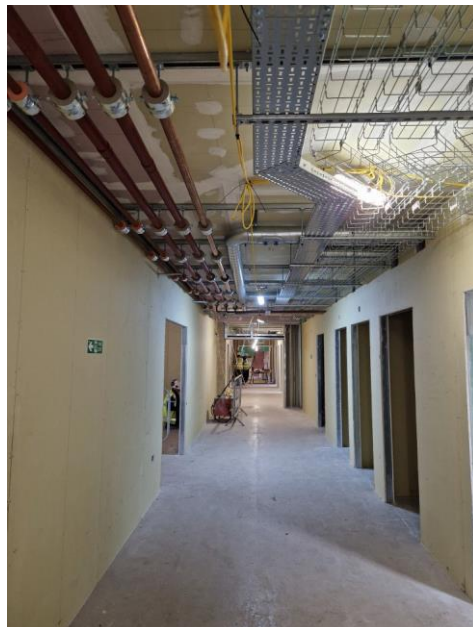

Cynllun Adeiladwyr Ystyriol

Gwefan Gofrestredig www.ccscheme.org.uk

Gwella Edrychiad; Parchu'r Gymuned; Diogelu'r Amgylchedd; Sicrhau Diogelwch Pawb; Gofalu am y Gweithlu

Os oes gennych chi unrhyw bryderon ynghylch y gwaith, cysylltwch â thîm safle Morgan Sindall Construction isod.

Uwch Reolwr y Prosiect:

Steve Birchenough: 07970 844859

Rheolwr y Safle:

Andrew Flynn: 07468 740153

Rheolwr Cynorthwyol y Safle:

Harri Mugford: 07929 718341

Peiriannydd:

Kian Stephens: 07976 554496



morgansindall.com

[@morgansindallci](https://www.instagram.com/morgansindallci)

@morgansindallci

Boundless possibilities
